



ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫັນສາ 2 ປີ 2025

ພາຍໃຕ້ PBC 6

ໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຂ-ບສພ)

ໄລຍະ 2

ວັນທີ 19 ທັນວາ 2025




**ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
HIV PBC 6 ປີທີ 2**



PBC 6.1: FSW tested @ 5 provinces target (Nov.25)

Target	Actual	Progress	HIV POS	Refer
94% (9,711)	83% (8,518)	88%	0.3% (24)	83% (20)

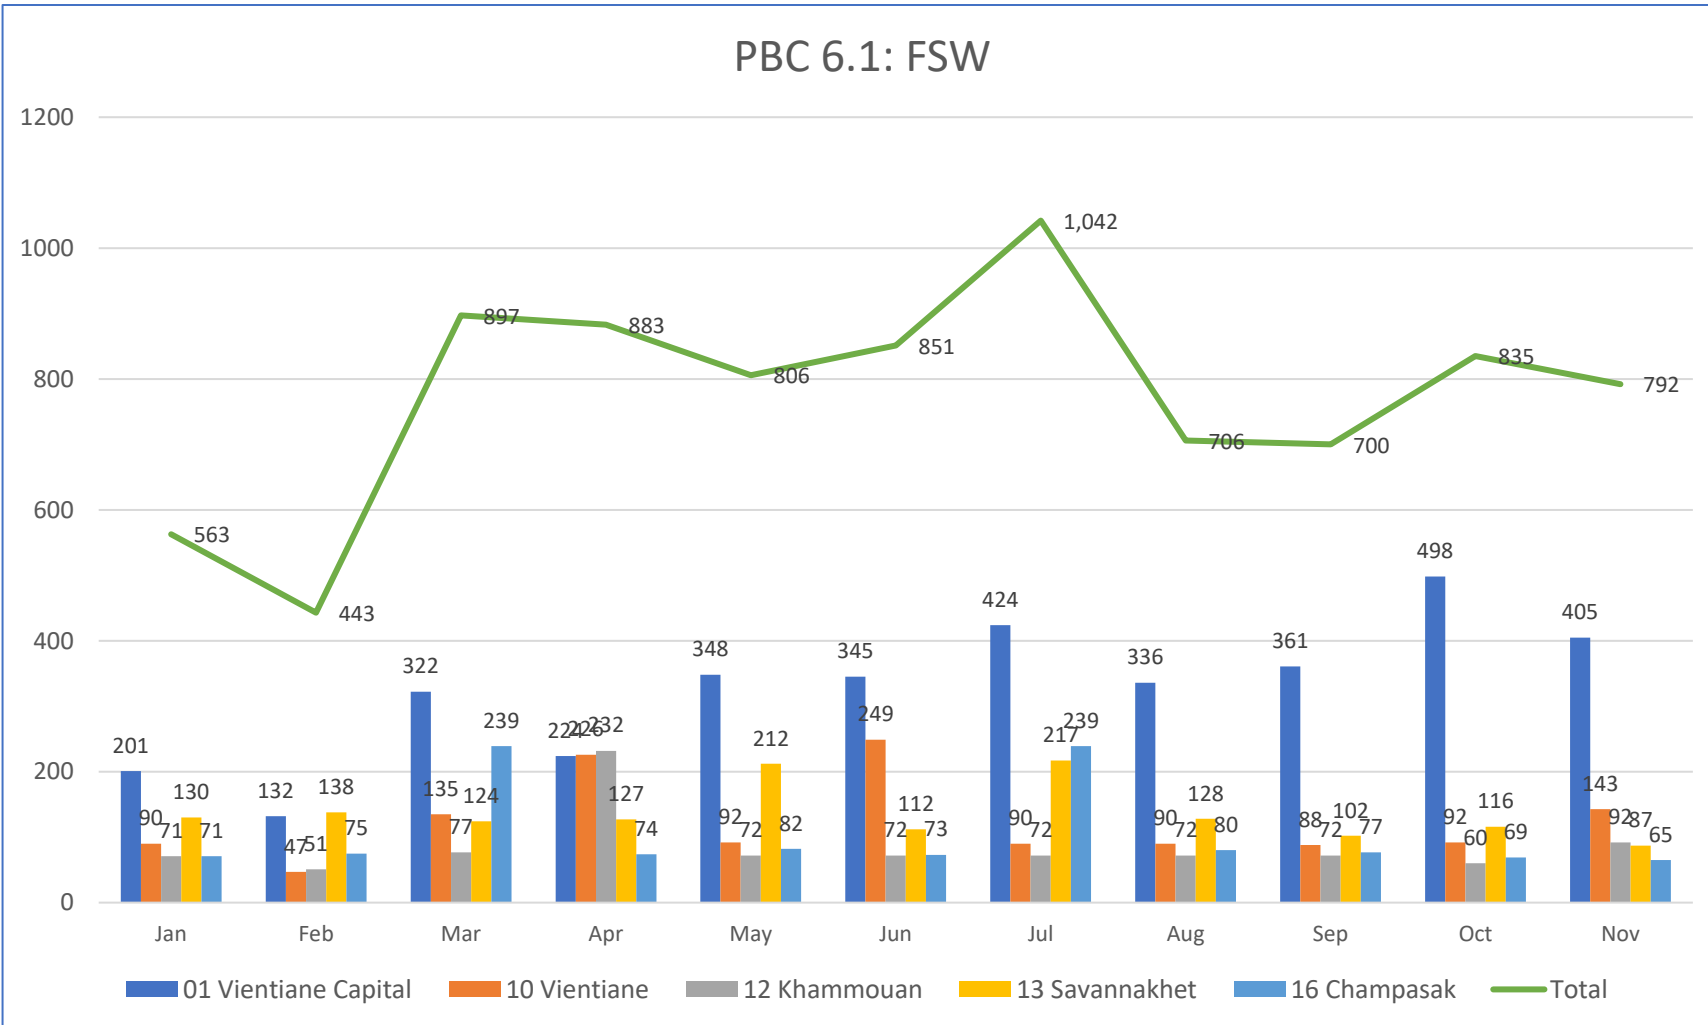


❑ ຜົນການຈັດຕັ້ງ:

- ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸ (ຍັງ**12%**)
- ງົບປະມານ **50%** ຖືກໂອນເຂົ້າ ວັນທີ **20/11/2025**
- ຕົວເລກລາຍງານ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການລົງໃນລະບົບ
- ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຂົ້າຫາການປິ່ນປົວ (**83%**)

PBC 6.2: MSM/TG tested @ 5 provinces target (Nov.25)

Target	Actual	Progress	HIV POS	Refer
70% (5,521)	63% (5,001)	91%	1% (51)	98% (50)

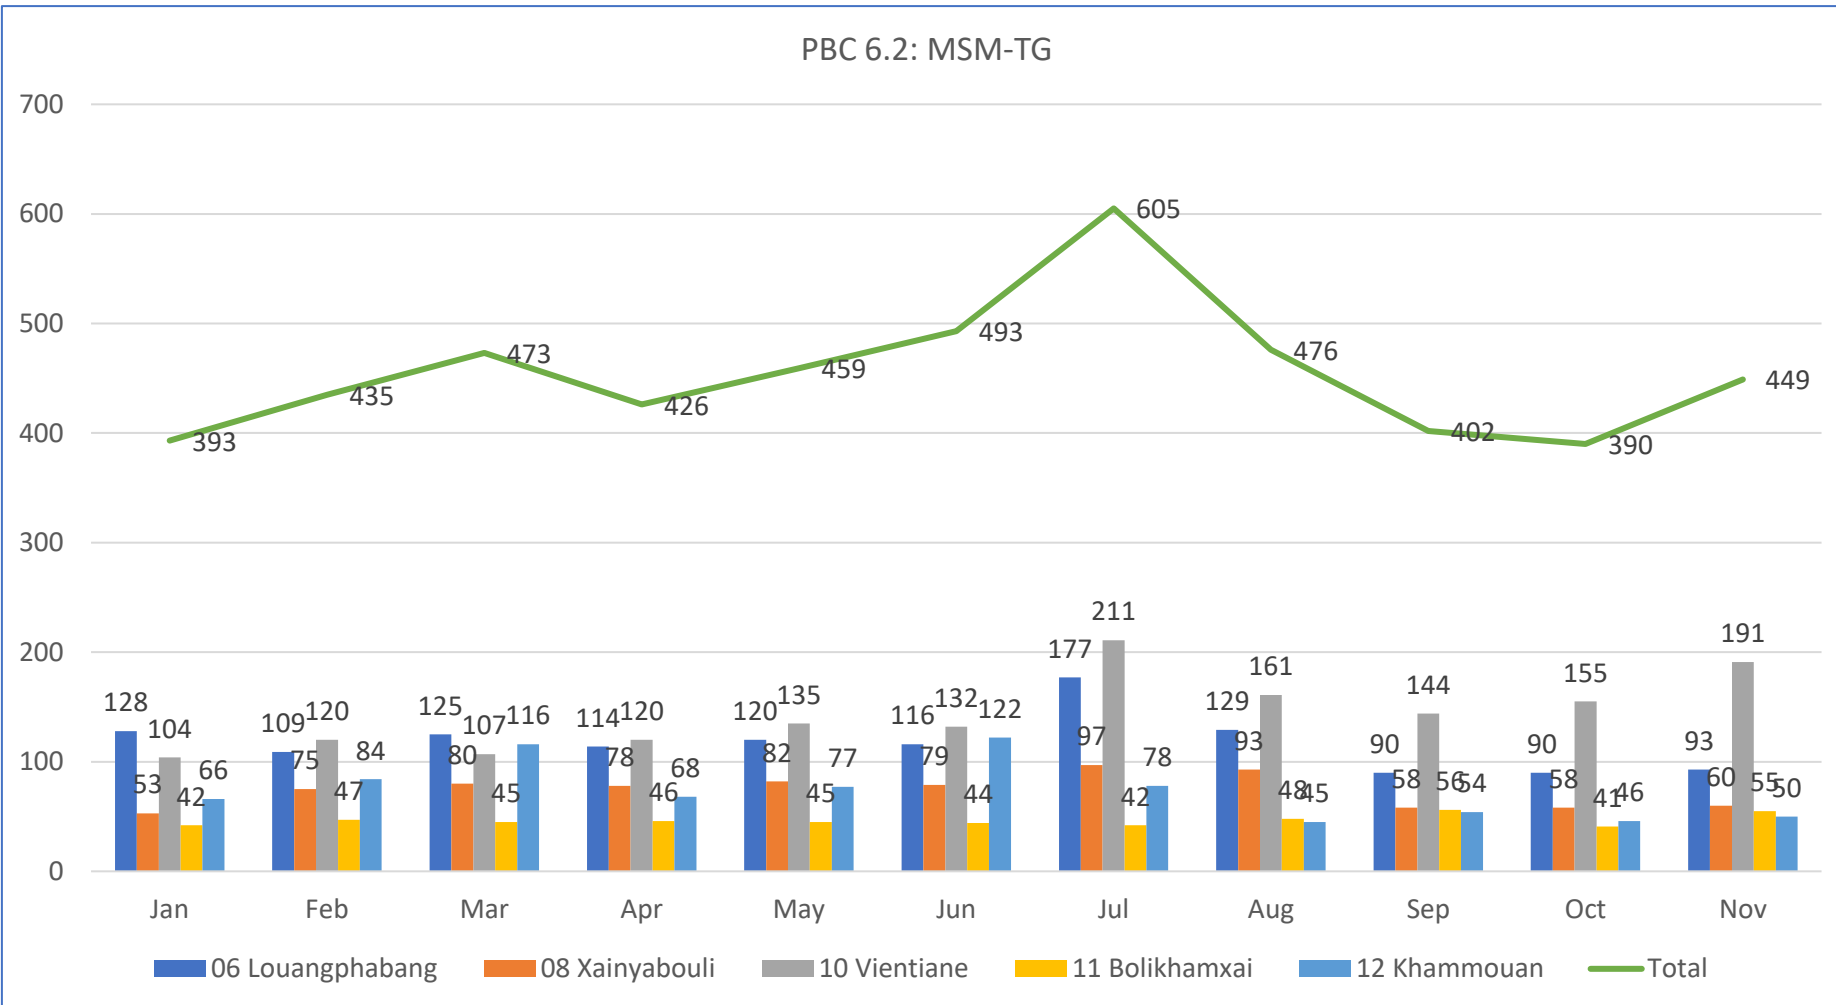


❑ ຜົນການຈັດຕັ້ງ:

- ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ພັນລູ (ຍັງ**09%**)
- ງົບປະມານ **50%** ຖືກໂອນເຂົ້າ ວັນທີ **20/11/2025**
- ຕົວເລກລາຍງານແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການລົງໃນລະບົບ
- % ການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ
- ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຂົ້າຫາການປິ່ນປົວ (**98%**)

PBC 6.3: PLHIV on ARV, nationwide

No.	ART Sites	Target	Actual	Progress
1	0001 CH Mahosot	66% (12,934)	2,053	108%
2	0002 CH Mittaphap		1,359	
3	0003 CH Setthathirath		3,909	
4	0005 CH Mother & Child		22	
5	0010 CH 5 Mesa (Police)		3	
6	0106 DH Xaithani		1	
7	0107 DH Hatxayfong		4	
8	0108 DH Sangthong		4	
9	0109 DH Pakngum		2	
10	02 PH Phongsali		39	
11	03 PH Louangnamtha		207	
12	0302 DH Sing		2	
13	04 PH Oudomxai		180	
14	05 PH Bokeo		300	
15	0502 DH Tonpheung		146	
16	06 PH Louangphabang		882	
17	0605 DH Nambak		65	
18	07 PH Houaphan		96	
19	08 PH Xainyabouli		290	
20	0807 DH Paklay		14	
21	09 PH Xiangkhouang		215	
22	0902 DH Kham		13	
23	10 PH Vientiane		337	
24	1005 DH Vangviang		36	
25	11 PH Bolikhamxai		99	
26	12 PH Khammouan		667	
27	13 PH Savannakhet		1,480	
28	1303 DH Atsaphangthong		17	
29	1305 DH Xepon		2	
30	1308 DH Songkhon		102	
31	1309 DH Champhon		2	
32	14 PH Salavan		97	
33	15 PH Xekong		55	
34	16 PH Champasak		1,195	
35	1604 DH Pakxong		2	
36	1607 DH Champasak		6	
37	1610 DH Khong		14	
38	17 PH Attapu		54	
39	18 PH Xaisomboun		10	
40	DH Sopbao		3	
Total		66% (12,934)	72% (13,980)	108%

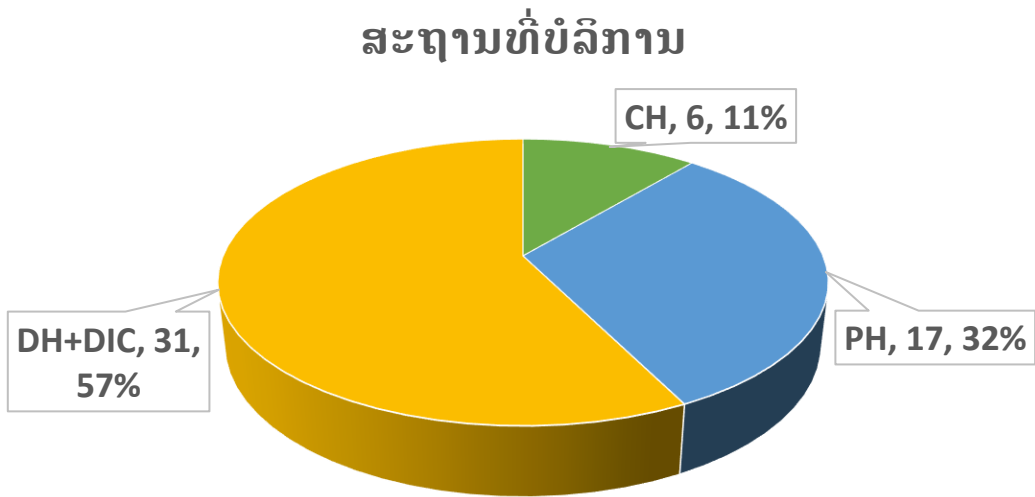


❑ຜົນການຈັດຕັ້ງ:

- ສາມາດບັນລຸ **(108%)**
- ງົບປະມານ **50%** ຖືກໂອນເຂົ້າ ວັນທີ **20/11/2025**
- ຕົວເລກລາຍງານ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການລົງໃນລະບົບ
- ສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການໄດ້ **54 ຈຸດ** ແລະ ມີການມາຮັບບໍລິການ **40 ຈຸດ (14 ຈຸດ ຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການ)**

PBC 6.4: MSM/TG on PrEP, Nationwide

Target	Actual	Progress
1,300	575	44%

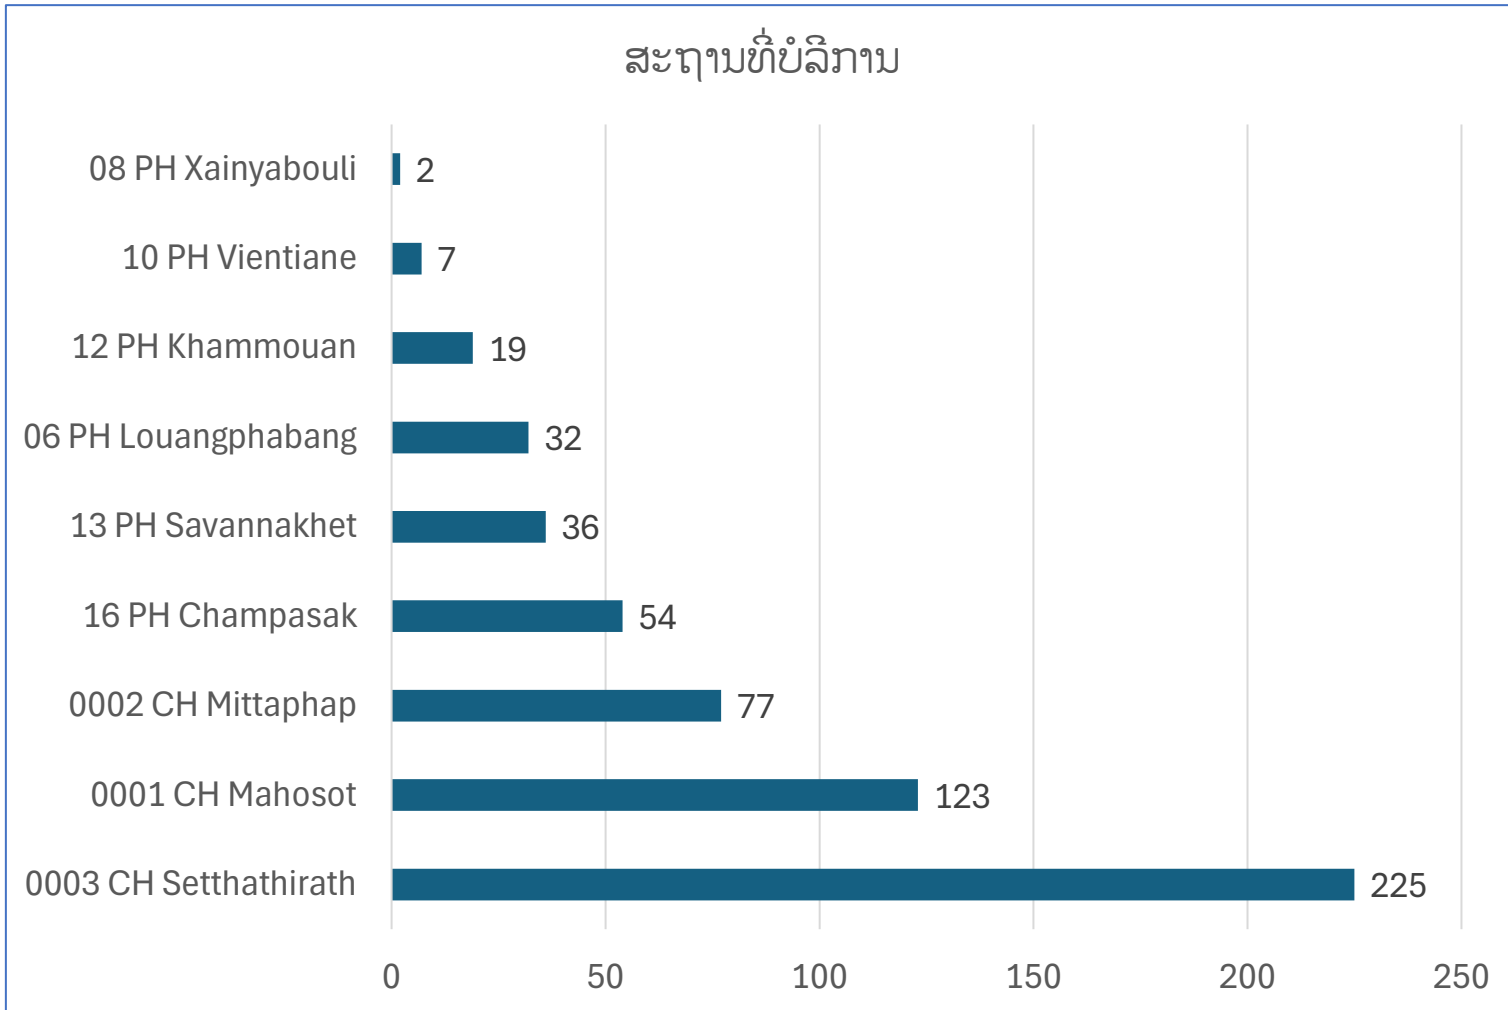

❑ ຜົນການຈັດຕັ້ງ:

- ບໍ່ສາມາດບັນລຸ (44%)
- ງົບປະມານ 50% ຖືກໂອນເຂົ້າ ວັນທີ 20/11/2025
- ຕົວເລກລາຍງານ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການລົງໃນລະບົບ
- ສາມາດຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການໄດ້ 54 ຈຸດ ແລະ ມີການໃຫ້ບໍລິການ 40 ຈຸດ (14 ຈຸດ ຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການ) ແຕ່ມີການມາຮັບບໍລິການພຽງ 09 ຈຸດ
- ແຂວງທີ່ມີກົດຈະກຳ ຊຸພຊ 5 ແຂວງ (PBC 6.2) ຍັງບໍ່ສາມາດລະດົມກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ມາຮັບຢາປ້ອງກັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

PBC 6.5: VL coverage among PLHIV, Nationwide

No.	ARV Sites	Target	Actual	Progress
1	CH Mahosot	95% (12,232)	1,624	94%
2	CH Mittaphap		1,119	
3	CH Setthathirath		3,526	
4	CH Mother		7	
5	PH Phongsali		6	
6	PH Louangnamtha		183	
7	PH Oudomxai		163	
8	PH Bokeo		262	
9	PH Louangphabang		765	
10	PH Houaphan		104	
11	PH Xainyabouli		173	
12	PH Xiangkhouang		86	
13	PH Vientiane		163	
14	PH Bolikhamxai		67	
15	PH Khammouan		600	
16	PH Savannakhet		1,389	
17	PH Salavan		23	
18	PH Xekong		11	
19	PH Champasak		1,097	
20	PH Attapu		20	
21	DH Tonpheung		87	
22	DH Paklay		5	
23	DH Kham		2	
24	DH Songkhon		3	
Total		95% (12,232)	89% (11,485)	94%

ດ້ານງົບປະມານ



ຕົວຊີ້ວັດ	ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	ວດປ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ	ຂັ້ນສູນກາງ	ຂັ້ນແຂວງ
PBC6	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ	28/02/2025	\$ 331,632	\$ 143,289
PBC6	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພ.ຕ.ພ	20/11/2025	\$ 306,904	\$ 138,017

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຈຳພັດ	ລາຍລະອຽດ	ຈຳນວນ
CHAS	ສຳເລັດ	08
	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	03
	ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຈຳພັດ	05
PEDA	ສຳເລັດ	03
	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	01
	ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຈຳພັດ	04
CHlas	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	09
APL+	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	09
PHO	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	

Actual Expenditures Summarize for CHAS, Hospitals in Vientiane Capital, Provinces & CSOs for PBC-6 (Jan-Sep 2025)

Item No.	Implementing Site	Amounts (USD)						Percentage (%)
		Balance brought forward from 2024	Receipt for Jan-Jun 25	Receipt for Jul-Dec 25	(Debit) for Jan-Dec 25	Payment (Credit) for Jan-Dec 25	Balance for 2025	
<u>I./</u>	<u>Central level</u>	<u>139,547.36</u>	<u>331,632.00</u>	<u>-</u>	<u>471,179.36</u>	<u>406,655.44</u>	<u>64,523.93</u>	<u>86.31%</u>
<u>II./</u>	<u>Provincial level</u>	<u>40,449.39</u>	<u>143,289.00</u>	<u>-</u>	<u>183,738.39</u>	<u>122,957.50</u>	<u>60,780.89</u>	<u>66.92%</u>
<u>PBC 6</u>	<u>Grand Total:</u>	<u>179,996.75</u>	<u>474,921.00</u>	<u>-</u>	<u>654,917.75</u>	<u>529,612.94</u>	<u>125,304.82</u>	<u>80.87%</u>

ສະຫຼຸບ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຕິດຕາມ ປີ 2025

2025 Procurement Update

GF procurement (2025)

- All commodities delivered.
- Early arrival reduced risk of pipeline disruption.
- Distribution across ART and POC Sites underway with MPSC.

Non-grant ARV Procurement

- CHAS has submitted ARV orders for the Non-grant fund
- ARV delivery is expected by Q4 2025.
- Coordination with the NPCO to ensure timely arrival.

GoL co-financing Update for 2025

CHAS submitted the 2025 procurement plan to the Ministry of Health as part of the co-financing requirement about 35% of total procurement needs and the plan has been approved.

Approved GoL budget for 2025		
Health Products	Budget (KIP)	Budget (USD)
ARV	8,040,714,000	\$ 372,462.20
HIV RTD tkits, Viral Load and AHD test kits	2,806,540,000	\$ 130,004.63
OI drugs	2,624,930,000	\$ 121,592.09
Lab consumables	276,100,000	\$ 12,789.51
Total	13,748,284,000	\$ 636,848.43

The approved budget represents the total GoL funding endorsed for 2025. The allocated budget shows how this approved funding was distributed across priorities. Because of the non-ARV grant support, funds were reallocated to increase the quantity of viral load cartridges and early infant diagnosis (EID) test kits, while also covering some activity implementation.

Allocated Budget for 2025 GoL procurement		
Health Products	Budget(KIP)	Budget(USD)
ARV	3,729,247,620	\$ 172,746.32
HIV RTD Kits, Viral Load and AHD test Kits	5,410,276,620	\$ 250,615.00
OI drugs	2,624,930,000	\$ 121,592.09
Lab Consumable	276,100,000	\$ 12,789.51
Total	12,040,554,240	\$ 557,743

❑ ຜົນ

ການຈັດຕັ້ງ:

- ເຄື່ອງຈັດຊື້ງົບ GF ໄດ້ຮັບຜົດແລ້ວ
- ງົບສົມທົບ ລັດຖະບານ ຢູ່ໃນ ຂະບວນການຈັດຊື້

ສະຫຼຸບ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຕິດຕາມ ປີ 2024-2026

2024-2026 Updated Procurement Plan

GF procurement (2024-2026)

GF HIV Products (Pharma and Non-Pharma)				
	2024	2025	2026	Total
HPMT Budget (USD)	\$ 1,236,196	\$ 1,178,085	\$ 1,150,846	\$ 3,565,127
Approved Procurement Plan (USD)	\$ 1,396,963	\$ 1,287,443	\$ 880,401	\$ 3,564,807
Total	\$ (160,767)	\$ (109,358)	\$ 270,445	\$ 320


Summary

The updated Global Fund procurement plan (2024-2026) shows slight deficits in 2024 (USD -160,767) and 2025 (USD -109,358), but a surplus in 2026 (USD +270,445), resulting in an overall balanced budget across the three years.

For 2025, the Government of Laos (GoL) has also allocated USD 557,743 for HIV commodities, including ARVs, HIV test kits, OI drugs, and lab consumables.

□ຄໍາແນະນຳຂອງ GF:

- ມີງົບຄົງເຫຼືອໃນຂະບວນການຈັດຊື້ພາຍນອກ 160,000\$ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ທາງ GF ແນະນຳໃຫ້ໄປປັບເປັນກົດຈະກຳ ແລະ ຈັດຊື້ຕາມການພິຈາລະນາ



2. For the HIV program, we recommend considering investments in the following priority areas:


- Explore activities to enhance the coverage/presence of KP programs reaching MSM (e.g increase the number of events/contacts with MSM)
- Assessing chemsex prevalence
- Interventions to support PrEP scale-up
- Interventions to support HIV-ST

ແຜນ AOP 2026 (PBC6)

ໃນການຈັດຕັ້ງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ໄລຍະ 2 (HANSA 2)

ງົບປະມານຂອງ PBC6 ໃນປີ 2026

Item No.	Descriptions	Budget (USD)	Remark
1	Annual budget 2026	962,968	Complete submit
2	Saving 2024 & Project Completion Budget 2024 (Saving 2024 = 50K & Project completion Budget 2024 = 170K)	220,000	Complete Submit
3	Additional fund	239,713	On Process to update based on GF commend (17/12/2025)
4	Saving Procurement 2024-2026	160,000	On Process to update based on GF commend (18/12/2025)
	Total budget (USD)	1,582,681	



Item No.	Implementers	Budget (USD)	Percentage (%)
		Y3 (2026)	Y3 (2026)
1	CHAS	822,229	52%
2	PHO	430,606	27%
3	PEDA	68,860	4%
4	CHAls	217,267	14%
5	APL plus	43,720	3%
	Total budget (USD)	1,582,681	100.00%

ຄໍາເຫັນຂອງ GF

(Additional and Saving 2026 Procurement Fund)

- **Additional fund (USD 239,713):**

- ➔ ຫຼຸດຈຳນວນ ຊ່ຽວຊານລົງ 2 ຄົນ, ເລື່ອງ AEM ແລະ ການຂຽນແຜນສະເໜີ ຮອບທີ 8 (GC8) **Please explore this with Expertise France.**
- ➔ ປັບງົບປະມານດັ່ງກ່າວມາເປັນກິດຈະກຳ: ການເຝິກອົບຮົມ PrEP ໃຫ້ ART/POC ທັງໝົດ
- ➔ ປັບTOR ຂອງຊ່ຽວຊານ UNAIDS

- **Saving Procurement fund (USD 160,000):**

- ➔ ຕັດຊ່ຽວຊານສໍາລັບການຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້
- ➔ ທົບທວນແຜນຈັດຊື້ນໍາຢາກວດເລືອດ ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃນການຂະຫຍາຍຮູບແບບການ ໃຫ້ບໍລິການ. ຫຼື ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າ ປະລິມານ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້ດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມໃຫ້ ແຜນຈັດຊື້ສົມທົບຂອງລັດຖະບານ



ຮ່ວມໃຈກັນກ້າວຂ້າມອຸປະສັກ ແລະ ປັບປຸງນຍຸດທະວິທີ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ

OVERCOMING DISRUPTION, Transforming the AIDS response

WORLD AIDS DAY



1st December 2025

